Atividade 7 - Definir processo, papéis e fluxo - ENTREGA FINAL

Utilize este arquivo como modelo para todas as entregas das atividades semanais (A1 a A15). Preencha os campos de identificação, o conteúdo solicitado no enunciado da atividade e, quando aplicável, a declaração de uso de Inteligência Artificial.

1. Identificação

Atividade (código e nome): _____7_____

Etapa (AP1 / AP2 / AS): _____

Equipe: _____

Integrantes: _Arthur Passos e Tiago Schulz_____

Data de entrega: 16/09_____

2. Conteúdo da atividade

Link Github:
https://github.com/arthurmatos-lgtm/Gest-o-de-Empr-stimo-de-Equipamentos-em-Universidades-Laborat-rios

1. Papel do Product Owner (Representatividade do Cliente)
Decisão: A Prof.ª Helena (Coordenadora de Curso e Chefe de Departamento) assume o papel de Product Owner (PO).
O PO deve representar legitimamente a voz do cliente, defendendo as necessidades da coordenação e dos alunos em conflitos de priorização. O Arthur e o Tiago focam integralmente na engenharia e no desenvolvimento. A Prof.ª Helena será consultada no início de cada Sprint para o refinamento do Backlog e na *Sprint Review* para a validação dos incrementos entregues.

2. Definição do Papel Fictício (Caroline)
"Caroline é um perfil de papel fictício criado para representar a capacidade operacional complementar de QA/Desenvolvimento no processo. As atribuições do papel são executadas na prática através do revezamento alternado entre os integrantes em cada Sprint, com o suporte de ferramentas de automação na revisão de código."

Divisão por Sprint:
Sprint 1: Tiago assume as responsabilidades de QA e testes de aceitação (Perfil Caroline), enquanto Arthur foca na implementação do Frontend e integração.

Sprint 2: Arthur assume as responsabilidades de QA e testes (Perfil Caroline), enquanto Tiago foca na implementação das regras de backend e APIs.

Suporte de Ferramentas: A revisão primária de *Pull Requests* (PRs) será automatizada via *Linters Actions* como triagem operacional antes da revisão de código entre os integrantes.

3. Coerência com o Ciclo de Vida da AP1
Ciclo de Vida Escolhido: Híbrido (Incremental + Ágil).

Dimensão Incremental: Garante a divisão do sistema em fatias funcionais de valor (módulos de consulta/reserva no Incremento 1 e gestão de penalidades no Incremento 2).

Dimensão Ágil (Scrumban): Operacionaliza o ciclo incremental combinando Sprints fixas do Scrum para planejamento e *reviews* com o quadro visual Kanban no GitHub Projects para limitar o trabalho em andamento (*WIP*) e gerenciar o fluxo contínuo.

4. Definition of Done (DoD) e Calendário de Sprints
Definition of Done (DoD)

Uma História de Usuário (US) ou funcionalidade só é considerada Pronta (Done) quando cumpre rigorosamente os seguintes critérios:

Código desenvolvido e aderente às regras de negócio (RNs).

Testes de aceitação baseados em BDD (*Dado-Quando-Então*) executados e aprovados sem falhas.


Revisão de código (*Code Review*) aprovada no *Pull Request* por pelo menos um outro membro.

Ausência de erros em verificações automáticas (*Linting/CI*).

Calendário e Mapeamento do MoSCoW por Sprint

Duração da Sprint: 2 semanas por ciclo.

Sprint	Período	Foco do Incremento	Itens do MoSCoW Incluídos
Sprint 1	Semanas 1 e 2	*Core System* & Bloqueio	**RF1** (Bloqueio por inadimplência), **RN2** (Prazo de 7 dias) e **RNF1** (Mensageria e alertas).
Sprint 2	Semanas 3 e 4	Gestão de Qualidade e Renovação	**RF2** (Lembrete 24h), **RNF2** (Desempenho/Disponibilidade) e **RF3/US1** (Renovação remota).

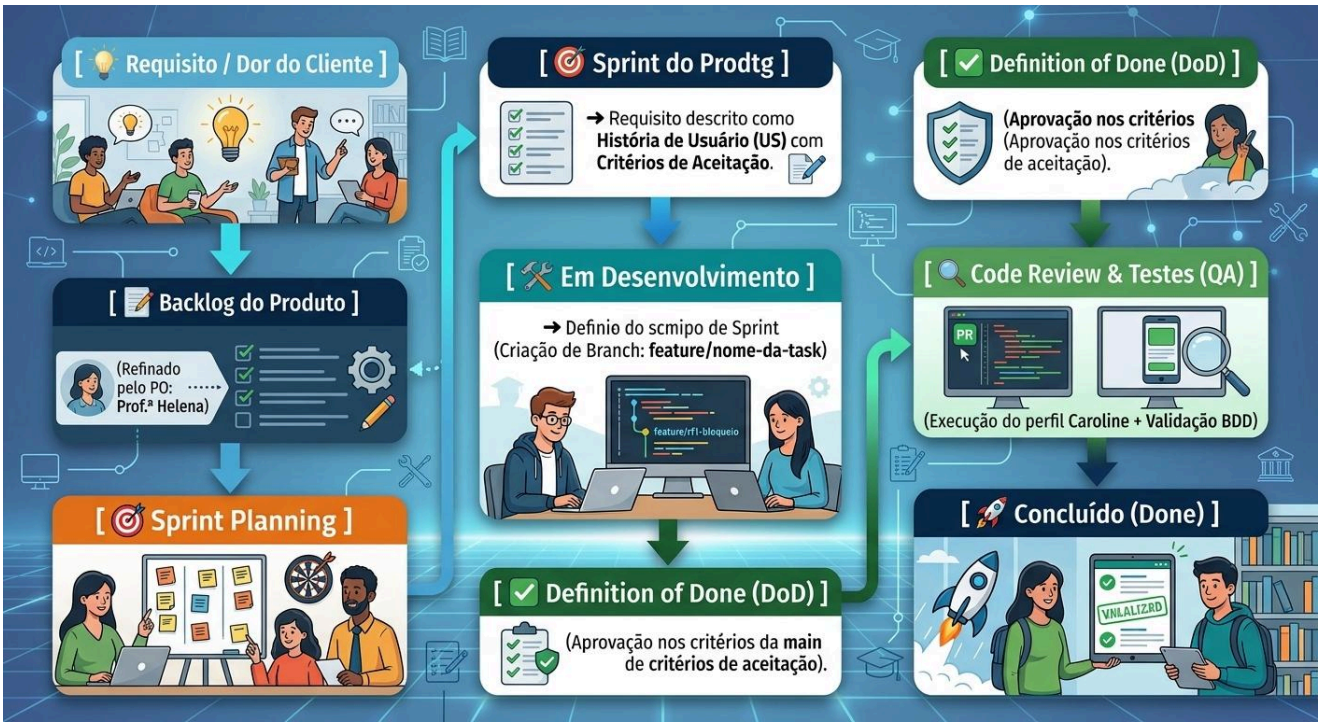

Ajustes Realizados com Base nas Falhas do Esboço Inicial

1. Correção do Papel de Product Owner (Representação Real do Cliente)

Inconsistência identificada: O esboço anterior colocava o Arthur como PO e desenvolvedor de interface, acumulando o papel de quem constrói com o de quem valida o negócio. Além disso, o perfil fictício foi alocado como desenvolvedor, quando a equipe de estudantes já cobria a execução.

Ajuste aplicado: A Prof.ª Helena (Coordenadora de Curso e Chefe de Departamento) foi formalizada como Product Owner (PO). Ela representa legitimamente a voz do cliente nas reuniões de planejamento e na validação das entregas.

2. Esclarecimento e Operacionalização do Perfil Fictício (Caroline)
Inconsistência identificada: Atribuir tarefas de execução (code review, testes e desenvolvimento) a um perfil fictício sem explicar quem cumpre essas tarefas na prática tornou a estrutura pouco realista.

Ajuste aplicado: O perfil foi declarado formalmente como uma capacidade complementar de QA/Desenvolvimento. Na prática, Arthur e Tiago alternam a responsabilidade desse papel a cada Sprint:

Sprint 1: Tiago assume os testes e QA (Perfil Caroline); Arthur foca no Frontend.
Sprint 2: Arthur assume os testes e QA (Perfil Caroline); Tiago foca no Backend.
Suporte operacional: Integração de *Linters* e verificações automáticas via GitHub Actions para triagem dos Pull Requests antes da revisão humana.

3. Vinculação Explícita com o Ciclo de Vida da AP1

Inconsistência identificada: O ciclo de vida híbrido (Incremental + Ágil) definido na AP1 não estava conectado de forma direta às práticas de desenvolvimento da AP2.
Ajuste aplicado: Declarou-se explicitamente que o Scrumban operacionaliza a estratégia da AP1:

Incremental: Divisão do sistema em duas entregas funcionais de valor (Core System/Inadimplência no Incremento 1 e Renovação/Qualidade no Incremento 2).

Ágil (Scrumban): Uso de Sprints fixas de 2 semanas do Scrum com o quadro visual Kanban no GitHub Projects para controle do fluxo de trabalho.

4. Definição Formal da Definition of Done (DoD) e Cronograma por Sprint
Inconsistência identificada: O fluxo inicial mencionava o status "Done", mas não detalhava os critérios objetivos necessários para uma tarefa ser considerada concluída, nem o mapeamento das entregas no tempo.

Ajuste aplicado:
Critérios da DoD: Código aderente às regras, testes BDD aprovados, revisão de código feita por um par, aprovação no pipeline de C.

Calendário (2 Sprints de 2 semanas):

Sprint 1: RF1 (Bloqueio), RN2 (Prazo de 7 dias) e RNF1 (Mensageria).

Sprint 2: RF2 (Notificação 24h), RNF2 (Disponibilidade/Desempenho) e RF3/US1 (Renovação remota com assinatura).

5. Reestruturação Limpa do Diagrama de Processo
Inconsistência identificada: A imagem gerada anteriormente continha erros de renderização gráfica, textos truncados e duplicação de caixas.

Ajuste aplicado: O diagrama foi recriado em formato estruturado, garantindo leitura limpa, sequencial e legível de todas as etapas.

3. Decisões e pendências

Registre as principais decisões tomadas pela equipe nesta etapa e o que ainda está pendente para a próxima entrega.

- Decisões tomadas: correções do esboço pedida pela professora, o uso da IA para criação de imagem e correção de palavras, papéis definidos junto com junto com a declaração do personagem fictício.
- Pendências / próximos passos:

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o Manual da Disciplina (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

( ) A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	**Objetivo do uso**	**Prompt ou resumo da interação**	**Resultado aproveitado / rejeitado / modificado**
Gemini 16/09	criação de imagem	gemini fez a criação da imagem do fluxo inicial do esboço	rejeitado algumas imagens que ele mandou, é decidimos usar essa
Gemini 16/09	correção de frases	usamos a IA para correção de palavras nos textos acima	aproveitamos a maioria que ela usou para usar como texto que mandamos para a atividade

Forma de verificação adotada pela equipe: escolha das imagens que o gemini ajudou e correção de escrita dos textos.

Responsável pela decisão final sobre o uso: Arthur

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):
Arthur Passos de Matos

Tiago Schulz
